

**Ing. Ouzký Miroslav Huntířov 191**

**Žádost o vyjádření k návrhu DIO a vedení objízdných tras při zvláštním užívání komunikace a uzavírkách komunikace**

**Silnice :** III/26819 a III/26817  
**Místo :** Jivina  
**Stavba:** Kanalizace Jivina  
**Omezení provozu :** úplná uzavírka  
**Termín :** 17.6. 2019 – 31.10.2019 včetně realizace povrchů

Zachování maximálního přístupu a obsluhy k přilehlým nemovitostem formou pohyblivého pracovního místa. Délka pracovního místa uvnitř uzavřeného úseku komunikace 30 m. Bezpečné oddělení pracovního místa od pohybu pěších pomocí fyzických zábran dle TP 66 se zachováním volného průchozího profilu o šířce minimálně 1,5 m.

**Žadatel:** POHL cz, a.s.  
Nádražní 25  
Roztoky  
252 63  
Odpovědná osoba p. Pavel Polena 602 470 837

**Za žadatele:** TRASO-DC s.r.o.  
ing. Ouzký Miroslav  
Huntířov 191  
405 02

V Děčíně

dne 24.5.2019

**TRASO-DC s.r.o.**  
Huntířov 191, 405 02  
Tel.. 733 762 439  
IČ: 02614359 DIČ: CZ02614359

TRASO-DC s.r.o.  
Huntířov 191, 405 02

místo: kancelář OÚ Jivina  
datum: 23. 5. 2019

### **Koordinační jednání stavby Kanalizace Jivina pro provedení prací v silnicích III třídy**

Předmětem koordinačního jednání byla realizace stavebních prací ve vozovkách silnic III/26819 a III/2681. Byly projednány následující body:

- A. Zástupci Policie ČR, dopravce ARRIVA Stř.Čechy a zástupci jednotlivých obcí vyslovili požadavek na zachování alespoň kyvadlového provozu v jednom jízdním pruhu za částečné uzavírky komunikace.
- B. Zhotovitel prací zajistil vytyčení jednotlivých šachet a vedení tělesa kanalizace v prostoru vozovky. Zástupce zhotovitele představil způsob realizace výkopových prací a nutnost úplné uzavírky komunikací.
- C. Zahájení prací v silnicích III třídy se předpokládá v 2 polovině měsíce června.
- D. Pro realizaci za úplné uzavírky byly dohodnuty následující podmínky:
  - 1. Pořadí etap při realizaci 1 - etapa I směr Mukařov, 2 – etapa III směr Mohelnice nad Jizerou, 3 – etapa II směr Klášter Hradiště nad Jizerou.
  - 2. V době letních prázdnin bude realizována etapa III a etapa II.
  - 3. Ke dni 1.7.2019 budou zahájeny práce na etapě III.
- E. Po celou dobu realizace prací v silnicích III třídy bude zachována možnost průjezdu vozidel křižovatkou a otáčení autobusů na ploše u objektu Obecního úřadu.

#### **Přítomní zástupci:**

Zhotovitele Pohl cz a.s.  
OU Jivina  
OU Horní Bukovina  
ARRIVA Střední Čechy  
OU Klášter Hradiště nad Jizerou  
MěU Mnichovo Hradiště  
PČR dopravní inspektorát Mladá Boleslav  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
OU Mukařov

Jmenný seznam viz. Prezenční listina

Zapsal: Ing Miroslav Ouzký


**TRASO-DC s.r.o.**

Huntířov 191, 405 02

Tel.: 733 762 439

IČ: 02614359 DIČ: CZ02614359




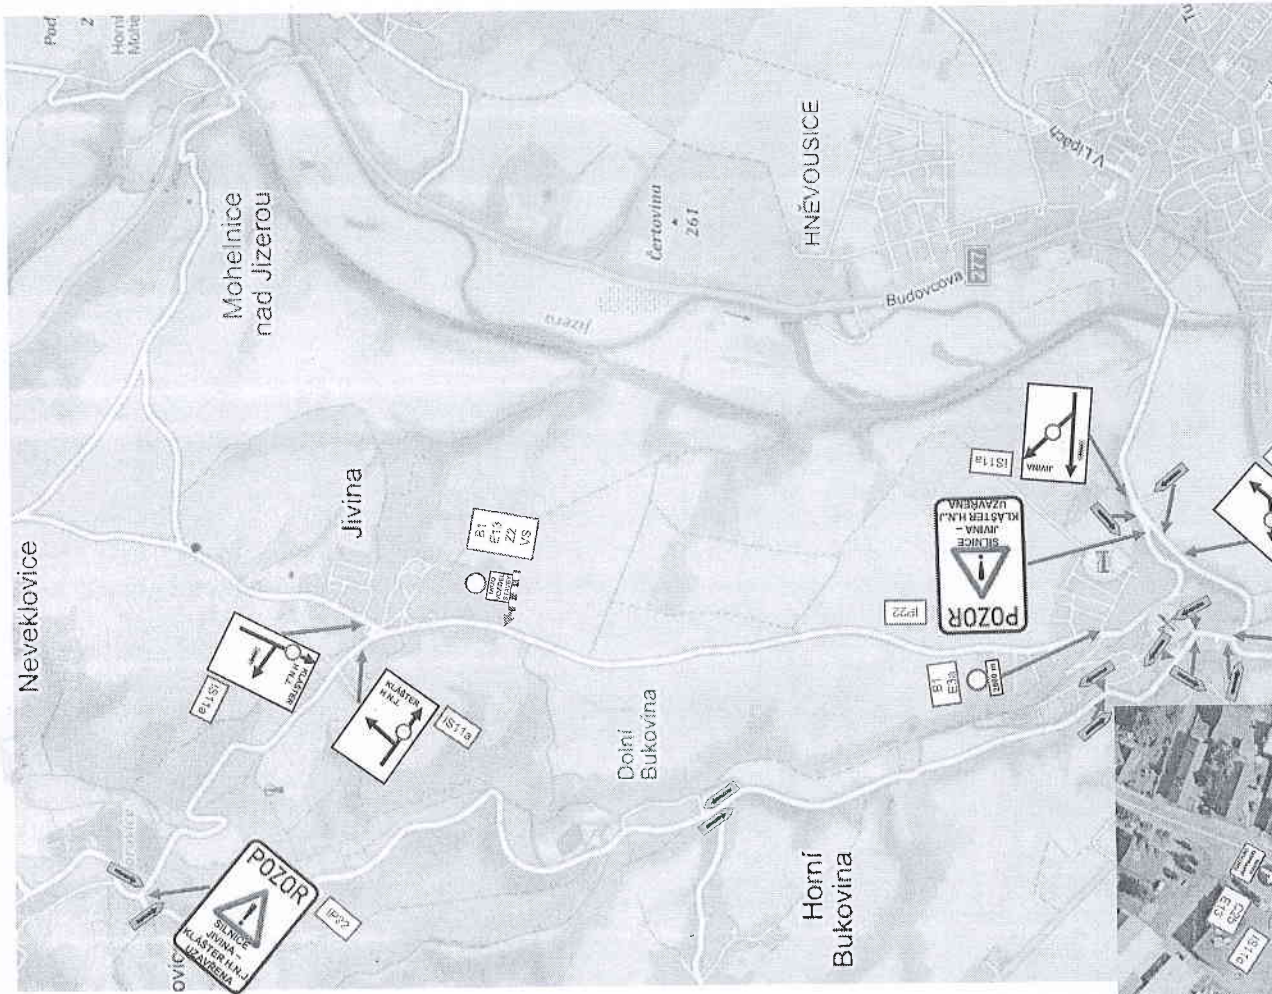

||

13 x IS11c


JIVINA KŘIŽOVATKA

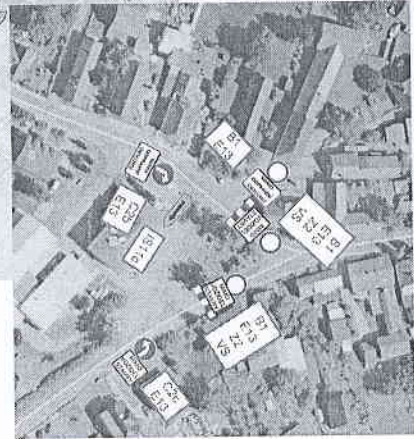

PO DOBU UZAVÍRKY DOČASNĚ ZNEPLATNÍ IS3c, IS3b JIVINA, IS3c KLÁŠTER HRADIŠTĚ N.J.


KANALIZACE JIVINA  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  
POHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO



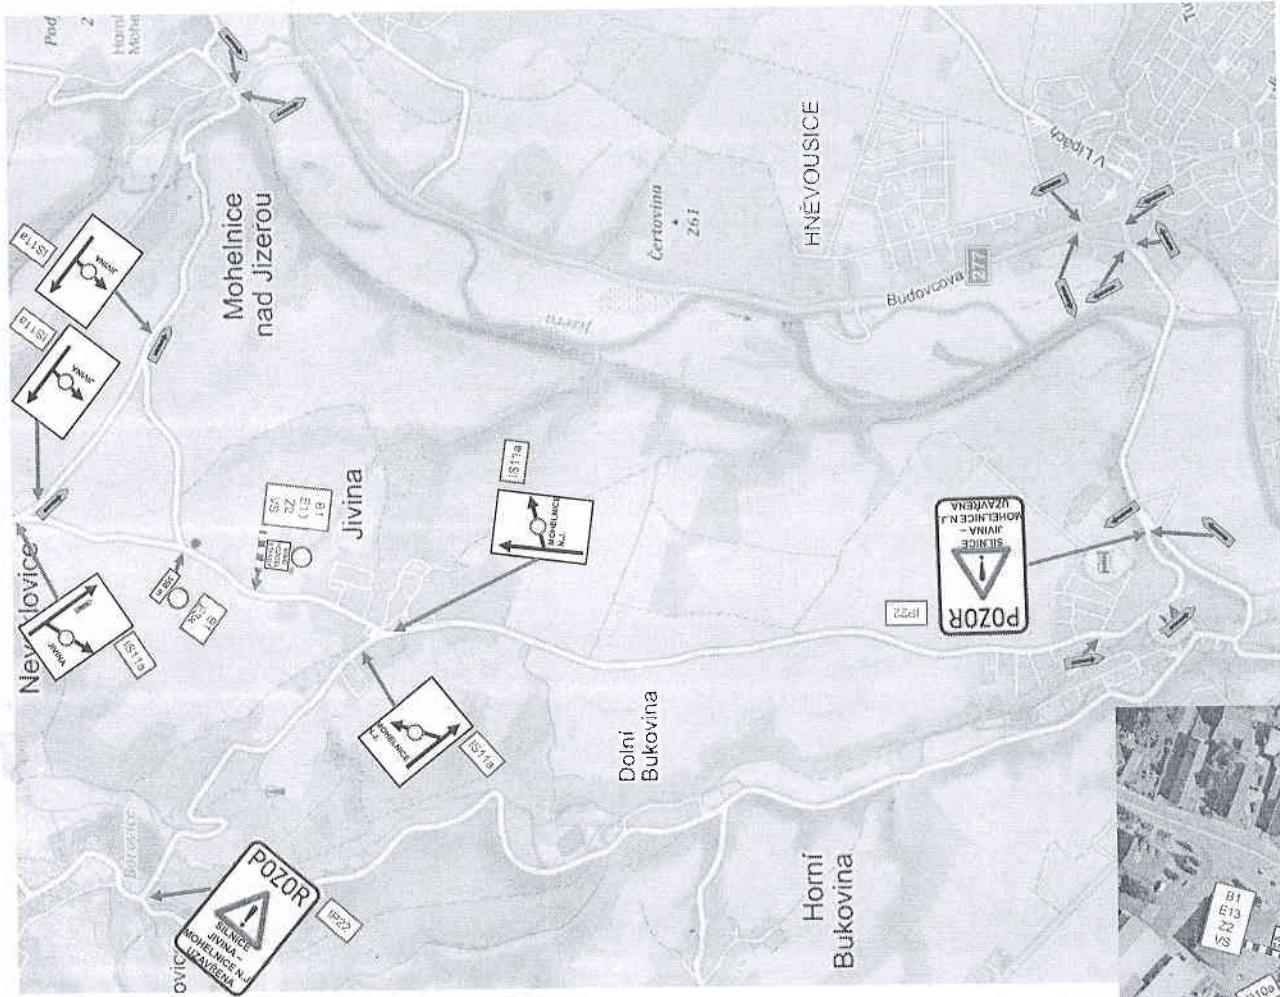

13 x IS11c

JIVINA KŘIŽOVATKA

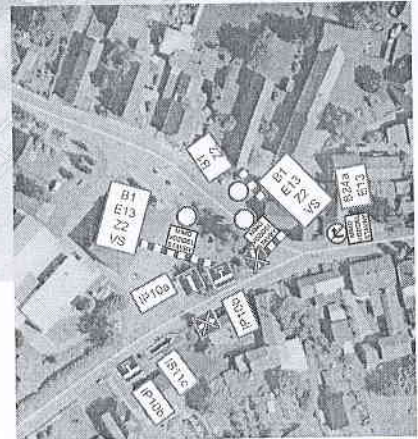

PO DOBU UZAVÍRKY DOČASNĚ ZNEPLATNIT IS3c, IS3b JIVINA, IS3c MOHELNICE N.J.

KANALIZACE JIVINA  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  
POHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO
